


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	59 NOLU KÖK YAPILMASI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Avanos Gülşehir Yolu 10. km TEİAŞ Trafo Merkezi Yukarı Kısım AVANOS
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Avanos trafo merkezinden çıkan fider 3 enerji nakil hattı, çok uzun olması ve dağıtım merkezinden çıkıp eski hatta bağlantı noktasına direk bağlanması nedeniyle yeni hattın bağlantı noktasına kesici ölçü kabini montajı yapılarak arızanın tespiti kolaylaşacaktır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	124091.888 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	121262.61 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	124091.888 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 98
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	ÜRGÜP 370 EVLER MAHALLESİ YENİ TRAFİO BÖLGESİ OLUŞTURULMASI VE TR44 KAPASİTE ARTIŞI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.07.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	370 Evler Mahallesi Ürgüp
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir ili Ürgüp İlçesine bağlı 370 Evler Mahallesinde yeni yapılaşma alanında mevcut trafo kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle yeni trafo bölgesi oluşturulması ve mevcut trafonun kapasitenin artırılması yapılacaktır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	506790.6575 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	342023.03 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	506790.6575 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 67
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	ACIGÖL FİDER 16 (KÖK BİNASI KONULMASI)
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	01.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Acıgöl Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Üzerinde yük çok olan Fider 16' yı kesici ölçü kabini konularak kabloların girdi çıktı yapılması. Arızaları önlemek amacı ile proje hazırlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	149.508,67 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	149.508,67 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	167.536,11 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%89,24
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	AYHANLAR TRAFİKO İLAVESİ VE KÖY ŞEBEKESİ İSLAHI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.07.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Ayhanlar Köyü Avanos
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir İli Avanos İlçesi Ayhanlar Köyündeki elektrik şebekesi köye ilk elektrik geldiğinde yapılmış olup, Şebeke ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Arıza fazlalığı ve süt sağma makinelerinin aynı anda kullanımı sebebiyle gerilim düşümü yaşanmaktadır. Bu sebeple ilave trafo yapılması ve şebeke ıslahı ile şebekedeki direklerin çoğunluğu değişecektir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	890348.24 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	714340.11 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	890348.24 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 80
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	BÜYÜKBURUNAĞIL KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ VE İRTİBATI YAPILMASI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.06.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Büyükburunağıl Köyü Hacıbektas/NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	60 KM uzunluğunda bulunan Enerji Nakil Hattına Monoblok Kök binası konularak gerek arızaya kısa sürede müdahale etme gerek tarımsal sulamadan gelen arızaların köy hatlarını etkilemesini azaltmak amacıyla yapılan yatırımdır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	112.330,14 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	107.077,49 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	112.330,14 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 95
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	CEVDET BEY SOKAK AYDINLATMA TESİS YAPIM İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	15.09.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Cevher Dudayev Mahallesi. Cevdet Bey Sokak Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Sokağın aydınlatmasının yetersiz ve hiç olması sebebi ile yeni aydınlatma tesisi yapılması planlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	44.539,30 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	42.164,68 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	44.539,30 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%94,67
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.Tesis çalışması devam ediyor.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	DERINKUYU F7 TARIMSAL SULAMA KÖK
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	10.07.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Derinkuyu / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Fider7 Hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirilmesi amaçlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	189.352,45 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	189.352,45 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	DERINKUYU F7-6 TARIMSAL SULAMA KÖK
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	10.07.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Derinkuyu / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Fider7 hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	202.080,32 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	202.080,32 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	ÜRGÜP DUAYERİ MAHALLESİ TRAFİ İLAVESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	12.10.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Duayeri Mahallesi Ürgüp
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir ili, Ürgüp ilçesine bağlı Duayeri mahallesinde mevcut şebekenin kolları uzun olması sebebiyle kış aylarında gerilim düşümü yaşanmaktadır. Bu sebeple yeni bir trafo bölgesi oluşturulması planlanmaktadır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	222238.022 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	33582.50 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	222238.02 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 15
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	YENİ AVANOS TM GÜLŞEHİR İM ENERJİ NAKİL HATTI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.06.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Yeniyaylacık Köyü Gülşehir/NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Gülşehir ilçesinin elektrik talebini karşılamak ve kesintisiz enerji verebilmek için 477 MCM kesitli yeni bir hat çekilmesi yatırımdır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	3.877.540,84 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	3.807.852,23 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	3.877.540,84 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 96
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	



BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	GÜLŞEHİR MERKEZ TR10 TRAF0 BÖLGEŞİ HİLAL YAPI KOOPERATİFİ YG-AG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.06.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Fatih mahallesi Gülşehir/NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Mevcut 160 kVA lık trafonun bulunduđu bölgede yeni binaların yapılması dolayı mevcut trafo yetersiz kalmaktaydı. Yapılan yarımıla 630 kVA olarak trafo deđiştirilmiş ve bölgenin enerji talepleri karşılanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	219.505,21 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	185.367,45 TL
2017 YILI ÖDENEĐİ	219.505,21 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 95
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur .
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	GÜNEYCE KÖYÜ SULAMA KÖK
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	07.06.2017 – 05.10.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Güneyce Köyü – Merkez / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır .
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	128.515,00 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	128.515,00 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KALABA YENİ MAHALLE TRAFİ İLAVESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	15.08.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Yeni Mahalle Kalaba Kasabası Avanos
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir ili Avanos İlçesi Kalaba Kasabasına bağlı Yeni mahallede şebekenin uzun olması sebebiyle yeni bir trafo bölgesi oluşturulması planlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	474992.81 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	313428.2 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	474992.81 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 66
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	 


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KAPAŞ SULAMA KÖK 2
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	07.06.2017 – 01.10.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Kaymaklı / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	92.130,06 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	92.130,06 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	AVANOS YUKARI MAHALLE KESTERİÇ MEVKİİ TRAFİ İLAVESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.07.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Yukarı Mahalle Kesteriç Mevkii Avanos
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir ili Avanos İlçesine bağlı Yukarı Mahalle Kesteriç Mevkii'ndeki mevcut şebekenin düzenlenmesi, yeni trafo bölgesi oluşturulması planlanmaktadır. Hat Sonundaki müşterilerin gerilim düşümü sorunu çözülecektir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	189.857.96 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	144.591.08 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	189.857.96 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 76
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİSLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	03.03.2017 – 01.06.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Ürgüp Ve Avanos İlçesine Bağlı Tüm Bölge
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Vatandaş Enerji Talebi ve Şebeke İyileştirmesi
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	366.603,38 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	366.603,38 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	366.603,38 TL
NAKDI GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİSLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	01.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Ürgüp Ve Avanos İlçesine Bağlı Tüm Bölge
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Vatandaş Enerji Talebi ve Şebeke İyileştirmesi
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	956.701.51 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	956.701.51TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	956.701.51 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KIZILKAYA YEŞİL HAT KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ VE İRTİBATI YAPILMASI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.06.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Kızılkaya Köyü Gülşehir/NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Kızılkaya hattının 67 nolu direğinden branşman alan toplamda 28 adet tarımsal sulama abonesi vardır.28 adet abone beton direkte bulunan seksiyonlerden enerji almaktadır yeşil hattın ana hattın uzunluğu 7,6 km dir tarımsal sulama abonelerinde sürekli kesinti yaşanmaktadır kesintinin yaşanmaması için kök binasının konulması
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	188.915,22 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	168.714,87 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	188.915,22 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	%95
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KOZAKLI TR9/A AYDINLATMASI YAPILMASI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.06.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Yeni mahalle Kozaklı/Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Kozaklı belediyesi yeni yapılan konutların aydınlatmasının yapılması
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	40.491,52 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	39.760,07 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	40.491,52 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%98,19
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİSLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	03.03.2017-01.06.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Hacıbektaş Gülşehir ve Kozaklı ilçeleri
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen taleplerin karşılanması ayrıca işletmeye ait taleplerin karşılanması yatırımdır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	542.918,75 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	
2017 YILI ÖDENEĞİ	542.918,75 TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırımla ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİSLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	06.06.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Hacıbektaş, Gülşehir ve Kozaklı İlçeleri
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen taleplerin karşılanması ayrıca işletmeye ait taleplerin karşılanması yatırımdır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	927.757,56TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	
2017 YILI ÖDENEĞİ	927.757,56TL
NAKİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	03.03.2017 – 01.06.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Köy Kasaba Merkez
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Küçük Ek Tesisler İşİ Vatandaşın enerji talebi, emniyet mesafesi sorunu gibi acil olan işlerin ivedi ile yapılması.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	326.434,92 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	326.434,92 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	326.434,92 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%100.00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100.00
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	01.06.2017 – 01.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Köy Kasaba Merkez
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Küçük Ek Tesisler İşİ Vatandaşın enerji talebi, emniyet mesafesi sorunu gibi acil olan işlerin ivedi ile yapılması.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	1.010.192,75 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	1.010.192,75 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	1.010.192,75 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİSLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	01.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Derinkuyu ilçesi ve Nevşehir Merkez İlçesi
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	844,772,46 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	
2017 YILI ÖDENEĞİ	844,772,46 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİSLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	03.03.2017 – 01.06.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Derinkuyu ilçesi ve Nevşehir Merkez İlçesi
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen acil taleplerin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlardır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	813.593,58 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	813.593,58 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	MERKEZ TR 124 C KOLU TRAFİ İLAVESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	22.08.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Uçhisar Kasabası Cezaevi Yolu - Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Artan Güç taleplerini karşılamak, Kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için Mevcut Şebekeye Trafo ilave edilmiştir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	153.002,163 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	153.002,163 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR FİDER 4 GÜLŞEHİR HATTINA KÖK BİNA YAPILMASI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	01.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Alacaşar yolu üzeri 3 km. Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Üzerinde yük çok olan Fider 4 ve 6' yı kesici ölçü kabini konularak kabloların girdi çıktı yapılması. Arızaları önlemek amacı ile proje hazırlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	322.004,30 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	265.585,6 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	322.004,30 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%89
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR MERKEZ AVANOS YOLU ORTA REFUJ AYDINLATMASI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	15.09.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallesi - Merkez / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Karayolları çalışmasından ve aydınlatma şebekesinin ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle aydınlatma hatları yenilenmektedir. 171 adet aydınlatma direği dikilecektir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	812.614,33 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	812.614,33 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR MERKEZ TR 104 DEPLASESİ ŞEBEKENİN YERALTINA ALINMASI VE AYDINLATMA YAPILMASI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	22.08.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	15 Temmuz Mahallesi Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Artan Güç taleplerini karşılamak, Kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yedek besleme hatları (RİNG) yapılarak. 250 kva direk tipi trafo 630 kVA ya yükseltilecek ve Monoblok içerisine alınacaktır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	321.9297 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	321.929,787 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR MERKEZ ÜRGÜP YOLU ORTA REFÜJ DEPLASESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	15.09.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi - Merkez / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Karayolları çalışmasından ve aydınlatma şebekesinin ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle aydınlatma hatları yenilenmektedir. 31 adet aydınlatma direği dikilecektir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	163.598,21 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	163.598,21 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR TOKİ 1,2,3 TRAAFOLARINA AİT ŞEBEKE VE AYDINLATMA TESİSİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	05.05.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Yol yapım çalışmalarından dolayı yolda kalan aydınlatma direklerinin uygun yere alınması ve yeni yapılar için şebeke ilavesi.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	322.339,64 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	285.654,77 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	322.339,64 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%77
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR TR 39 KULE TIPI BINANIN MOD BINA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	14.08.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Mehmet Akif Ersoy Fevzi Çakmak Caddesi Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Şebeke ıslahı ekonomik ömrünü tamamlayan cadde üzerinde bulunan hatların yer altına alınması.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	1.148.077,39 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	893.424.35 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	1.148.077,39 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%77
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR TR64' ÜN MOD BİNA OLARAK YAPILMASI VE AG VE OG HATLARININ DA YER ALTINA ALINMASI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	14.08.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Raşit Bey Mahallesi Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Yeni imar durumuna göre aydınlatma şebekesi yapılması ve Belediye ' ye ait yeni yapılan restoranda enerji verilmek amacı ile proje hazırlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	243.502,36 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	209.155,86 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	243.502,36 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%85
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR TR135 VE 134' ÜN C KOLLARININ YER ALTINA ALINMASI İŞİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	14.08.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Bahçeli Evler Mahallesi Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Ekonomik ömrünü tamamlayan şebekenin yer altına alınması ve artan güç talebini karşılamak için yapılan yatırımdır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	815.108,29 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	590.771,63 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	815.108,29 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%72
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	ÖMER UÇAR (21. MADDE KAPSAMINDA YAPILAN TESİS İŞİ)
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	08.10.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Nar Kasabası Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Enerji talebini karşılamak için elektrik nakil hattının yapılması işidir.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	41.104.97 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	41.104.97 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	41.104.97 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

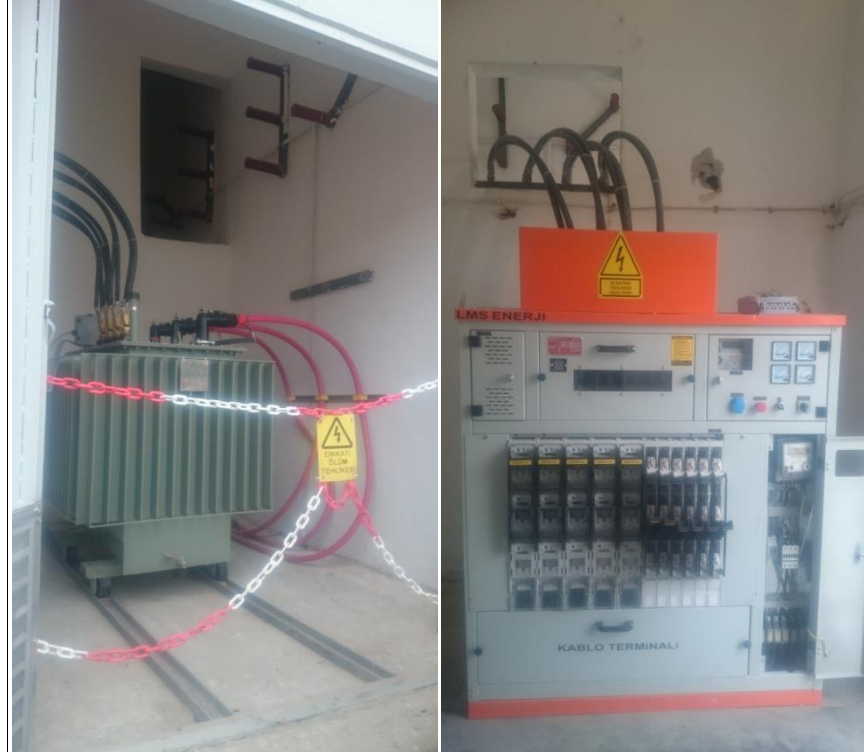
BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	ÖZKONAK DAĞITIM MERKEZİ YAPILMASI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	10.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Ragıp Üner Mah. Özkonak Kasabası Avanos
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Özkonak Kasabasına gelen enerji nakil hattı korumasız olarak şebekeye bağlanmaktadır. Ve bir arıza durumunda bütün kasaba enerjisiz kalmaktadır. Dağıtım merkezi yapılarak, arızanın tespiti ve sürekliliği sağlanacaktır. Ayrıca Göynük köyüne alternatif besleme için hat yapılacaktır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	679646.82 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	534602.17 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	679646.82 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 79
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	NEVŞEHİR 105 TR GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE ISLAHI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	07.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	15 Temmuz Mahallesi Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Artan Güç taleplerini karşılamak, Kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yedek besleme hatları (RİNG) yapılarak. 250 kva direk tipi trafo 630 kVA ya yükseltilecek ve Monoblok içerisine alınacaktır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	277.376,52 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	277.376,52 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	ÜRGÜP KAVAKLIÖNÜ MAHALLESİ TR8 – TR9 TRAF0 KAPASİTE ARTIŞI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	22.08.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Kavaklıönü Mahallesi Ürgüp
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Kavaklıönü Mahallesi, Osman Elmacı Cad, 32 Cad ve Yunus Emre Caddesindeki yapılaşma sebebiyle Mevcut Trafonun kapasitesinin artırılması planlanmaktadır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	50083.29 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	45892.41 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	50083.29 TL
NAKDI GERÇEKLEŞME	% 92
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	YAZIHÖYÜK SULAMA KÖK 1
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	07.06.2017 – 31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Yazıhüyük Kasabası – Derinkuyu / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	129.236,45 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	129.236,45 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	


BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	YAZIHÖYÜK SULAMA KÖK 3
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	07.06.2017 – 05.10.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Yazihöyük Kasabası – Derinkuyu / Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Tarımsal sulama hatları ile köy Şebekesinin ayrıştırılarak arıza sayılarının düşürülmesi ve Ana hattımızın üzerindeki arızaların asgariye indirgenmesi amaçlanmıştır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	131.620,95 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	131.620,95 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KÜÇÜK EK TESİSLERİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	06.06.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Hacıbektaş, Gülşehir ve Kozaklı İlçeleri
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Vatandaşlardan ve Mahalli idarelerden gelen taleplerin karşılanması ayrıca işletmeye ait taleplerin karşılanması yatırımdır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	927.757,56TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	
2017 YILI ÖDENEĞİ	927.757,56TL
NAKDI GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	GÖREME BELEDİYESİ TRAFİKO İLAVESİ
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	01.06.2017 –21.10.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Göreme Kasabası İsalı Mahallesi - Merkez Nevşehir
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Artan Güç taleplerini karşılamak, Kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yedek besleme hatları (RİNG) yapılarak. Monoblok içerisine alınacaktır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	433.034,84 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	433.034,84 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

BİTEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	KANLICA KARASENİR HIZLI TREN HATTI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	28.11.2017-31.12.2017
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Kanlıca Karasenir Köyleri Kozaklı/NEVŞEHİR
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Hızlı tren hattının geçmesinden dolayı mevcut havai elektrik hattının yeraltına alınması yatırımdır.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	267.182,63TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	235.887,85 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	267.182,63 TL
NAKDI GERÇEKLEŞME	%94
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	Yatırıma ilişkin herhangi bir sorun yoktur.
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	
